

◇八本松コース グリーン改修工事状況

5月12日 現在

ホールNo.		播種	発芽	殺菌剤散布	施肥	殺虫剤散布	第1回刈込	その他
1H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	散水は降雨を除き毎日実施
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
2H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
3H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
4H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
5H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
6H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
7H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
8H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
9H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
PG南	予定	5月中旬	5月下旬	6月初旬	6月初旬	6月中旬	6月下旬	
	終了							
ホールNo.		播種	発芽	殺菌剤散布	施肥	殺虫剤散布	第1回刈込	その他
10H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	散水は降雨を除き毎日実施
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9			
11H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9			
12H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9			
13H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9			
14H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
15H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
16H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
17H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/3	5/3	5/9			
18H	予定	4月下旬	5月初旬	5月初旬	5月中旬	5月中旬	5月下旬	"
	終了	4/25	5/2	5/3	5/9			
PG北	予定	5月中旬	5月下旬	6月初旬	6月初旬	6月中旬	6月下旬	
	終了							

9H全景




9H接写



18H全景



18H接写

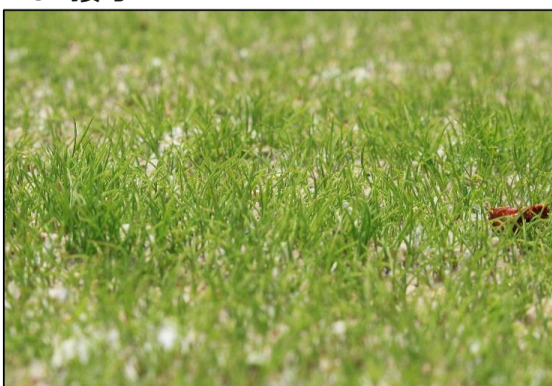

会員の皆様へ

八本松コース工事状況の視察会を来る5月19日(日) 6月16日(日) ①13:00 ②15:00の1日2回行います。ご希望の方は、ご自由にお越しください。

※工事箇所内に入ります。靴等服装にご注意ください。
